

1-Table

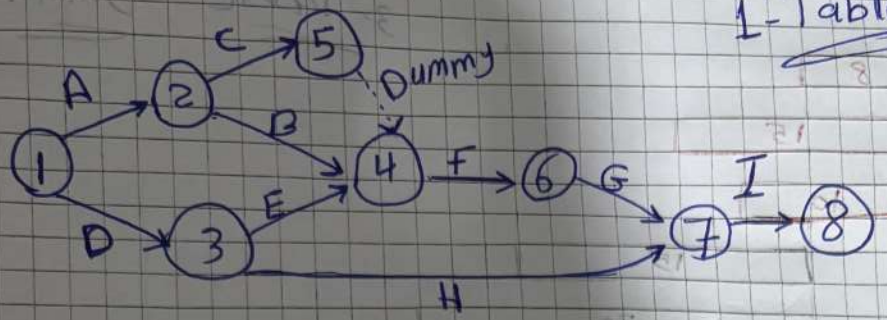


2-Table

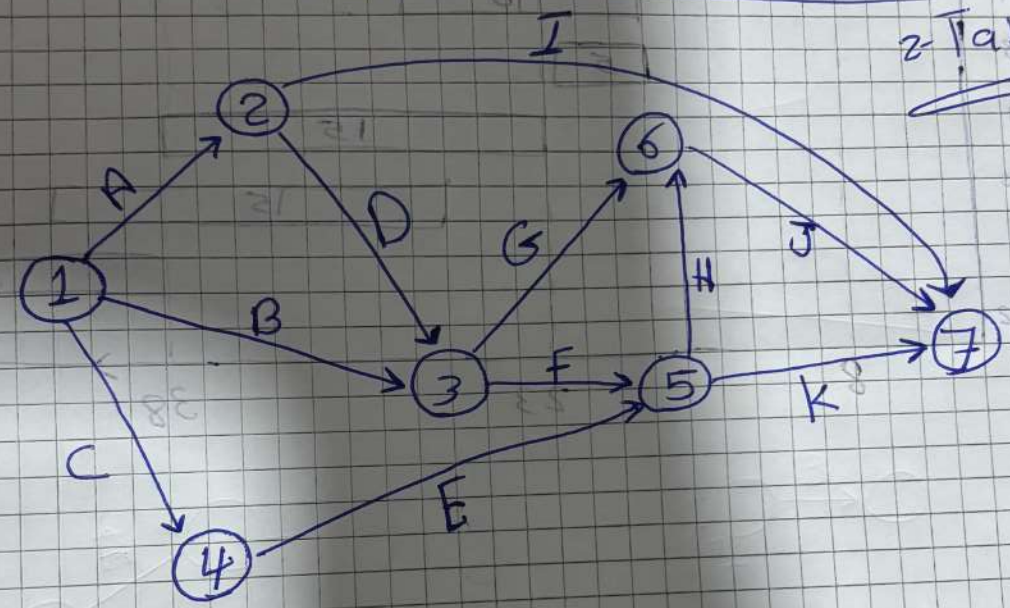

3-Table

Pert

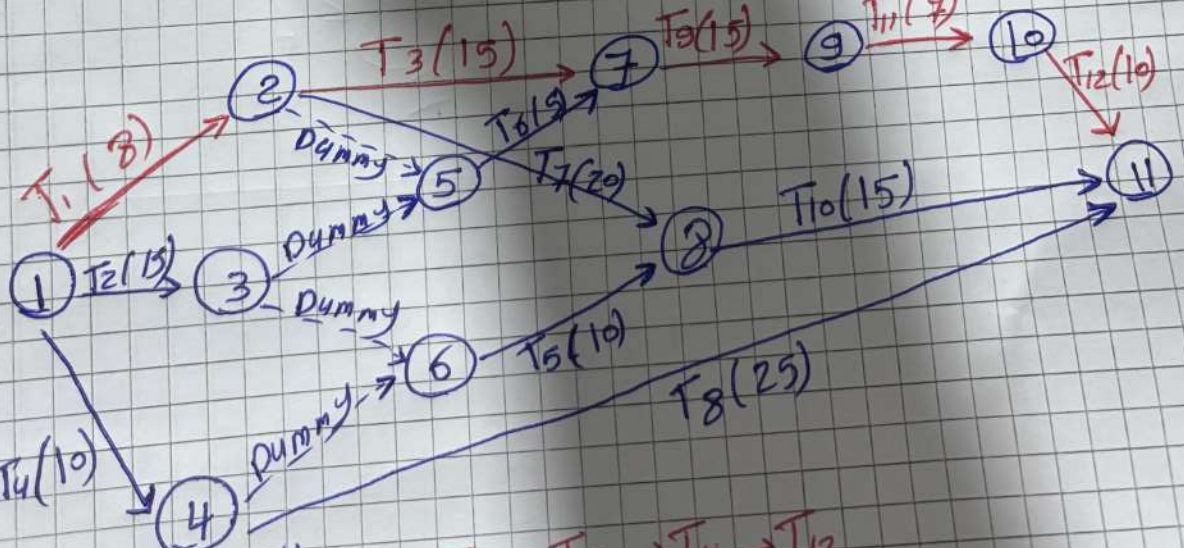

- Critical Path $T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_9 \rightarrow T_{11} \rightarrow T_{12}$
- minimum Duration Time = 55 day (dashed arrow = dummy acti

Task 3 - Gantt Chart

Activity	Duration (Days)	Predecessor
T1	8	-
T2	15	-
T3	15	T1
T4	10	-
T5	10	T2, T4
T6	5	T1, T2
T7	20	T1
T8	25	T4
T9	15	T3, T6
T10	15	T5, T7
T11	7	T9
T12	10	T11

